



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en las calles: Revolución entre Solidaridad y Aquiles Serdán; Aquiles Serdán entre Revolución y Venustiano Carranza; Venustiano Carranza entre Aquiles Serdán y Lateral de canal, Incluye: Agua Potable y Drenaje Sanitario en calle Venustiano Carranza entre Aquiles Serdán y Manuel Buenrostro, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas**, sustentada en el contrato **SOP-REY-FAISM-033-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **12 de Mayo de 2017**, reunidos en las oficinas de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Carlos Alberto Cano Martínez**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Caap del Noreste, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama Alemán**, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.



**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Caap del Noreste, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
CON-030515-LD2

CNO -

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Sub-Secretaria de Obras Publicas y Construcción.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construccion de Drenaje Pluvial Superficial en las calles: Revolución entre Solidaridad y Aquiles Serdán; Aquiles Serdán entre Revolución y Venustiano Carranza; Venustiano Carranza entre Aquiles Serdán y Lateral de canal, Incluye: Agua Potable y Drenaje Sanitario en calle Venustiano Carraza entre Aquiles Serdán y Manuel Buenrostro, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.
- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
**23 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-033-16-LP
\$ 5,414,073.36 INCLUYE I.V.A**



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

- 2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016(Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
Faismun

- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública


- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
24 de Mayo de 2016

- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
21 de Agosto de 2016

- 3.5. Fecha real de iniciación.
08 de Julio de 2016

- 3.6. Fecha Real de Terminación.
20 de Febrero de 2017

Faismun





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1994043
Importe: \$ 541,407.34 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 23 de Mayo de 2016
Afianzadora: SOFIMEX, S.A.

4.2. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del **Convenio Modificatorio Adicional al Monto del Contrato** del contrato.

Fianza N° 1994043
Importe: \$ 541,407.34 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 22 de Julio de 2016
Afianzadora: SOFIMEX, S.A.

4.3. Para asegurar los bienes y riesgos que se deriven del contrato.


Póliza N° A736005195
Suma Asegurada: \$ 930,000.00
Vigencia: 24 de Mayo de 2016 al 21 de Septiembre de 2016.
Aseguradora: ABA Seguros, S.A. de C.V.

4.4. Para asegurar los bienes y riesgos que se deriven del contrato.

Póliza N° A736005195
Suma Asegurada: \$ 930,000.00
Vigencia: 21 de Septiembre de 2016 al 04 de Enero de 2017.
Aseguradora: ABA Seguros, S.A. de C.V.

4.5. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1994050
Importe: \$1,624,222.01 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 23 de Mayo de 2016.
Afianzadora: SOFIMEX, S.A.





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

4.6. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 2092104

Importe: \$ 284,743.65 INCLUYE I.V.A.

Fecha: 12 de Mayo de 2017

Afianzadora: SOFIMEX,S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	01 de Agosto de 2016	08 de Julio de 2016 al 31 de Julio de 2016	\$ 879,583.05
Estimación Extraordinaria			
2.	01 de Agosto de 2016	08 de Julio de 2016 al 31 de Julio de 2016	\$ 10,492.04
3.	01 de Septiembre de 2016	01 de Agosto de 2016 al 30 de Agosto de 2016	\$ 41,365.28
4.	30 de Septiembre de 2016	31 de Agosto de 2016 al 29 de Septiembre de 2016	\$ 41,969.71
5.	03 de Noviembre de 2016	30 de Septiembre de 2016 al 29 de Octubre de 2016	\$ 398,158.58
6.	16 de Febrero de 2017	30 de Octubre de 2016 al 30 de Noviembre de 2016	\$ 8,344.96
7.	16 de Febrero de 2017	01 de Diciembre de 2016 al 31 de Diciembre de 2016	\$ 233,040.71
8.	16 de Febrero de 2017	01 de Enero de 2017 al 31 de Enero de 2017	\$ 439,368.70
Estimación Finiquito (terminación anticipada)			
9.	21 de Febrero de 2017	01 de Febrero de 2017 al 20 de Febrero de 2017	\$ 402,363.63
Sub-Total:			\$ 2,454,686.66
16% I.V.A.			\$ 392,749.86
Total			\$ 2,847,436.53

El cual forman parte integral de la presente Acta.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

VI. De las sanciones.
No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:


Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Trazo y nivelación topográfica para obras de pavimento, terracerías y vialidades, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, equipo, herramienta y mano de obra.	M2	3844.13	2351.39
TERRACERIAS			
Excavación para apertura de caja, en material tipo A y/o B incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	4411.90	2584.03
Carga mecánica y acarreo en camión del material producto de corte a tiro libre fuera de la obra, volumen medido compacto, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	4411.90	2584.03
Tratamiento de terracerías a nivel de subrasante de 15 cm de espesor, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado y compactado al 85% proctor como mínimo, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M2	3844.13	1050.87
Formación de sub base de 30cm. Con palancón canto rodado (miguel alemán) para estabilizar suelo en áreas de vialidad. Incluye: suministro, acarreos, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	1153.34	706.56
Formación de base de 20 cm. De espesor con material de banco tipo revestimiento con 2% de cemento, calidad base, que cumpla	M3	768.83	372.80

Z. Rodríguez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

con las especificaciones de la SCT, acamellonado, humedecido, homogenizado, tendido, conformado, y compactado al 95% PVRS incluye: suministro, acarreo, equipo, herramienta, mano de obra.			
GUARNICIONES Y BANQUETAS			
Construcción de guarnición trapezoidal (sección 0.35 m2) a base de conc. Prem. F'c=150kg/cm2, tma 19 mm, rev. Nor. (8-12cm), vrs de 3/8" @ 1.0 MTS, en escuadra de 15 x 25cm. De largo, con 2 vs de 3/8" longitudinales, pasajuntas @3.00 m. Incluye: Cimbra, descimbra, herramienta y mano de obra.	MI	908.47	116.03
Construcción de dentellón integral a la losa de dimensiones DE ACUERDO A PROYECTO, a base de concreto Premezclado F'c=300kg/cm2, tma 19 mm, R. N. de 10 a 12cm, varillas longitudinales de 1/2" con estivos de 1/2" a cada 2.00m. Incluye: Excavación y/o relleno compactado, cimbra, descimbra, acabado llaneado y volteador en juntas y aristas, materiales herramienta y mano de obra.	M	72.95	7.63
Conformación del terreno natural para construcción de banqueteta, con material tipo a y/o b de 0 a 20 cm. De espesor promedio, producto de excavación, incluye: afloje extracción, amacice, afine de plantilla, herramienta y mano de obra.	M2	1984.56	108.86
Construcción de banqueteta de 10 cm. De espesor concreto premezclado f'c=150 kg/cm2 TMA de 19 mm. R. N. (10 a 12cm), juntas frias @3.00 mts. Acabado escobillado fino, volteador en juntas y aristas incluye: cimbra, descimbra, materiales y herramienta.	M2	1984.56	108.86
Relleno con material producto de corte en formación manual para banquetetas,	M3	58.46	0.00

F. Escobedo

[Handwritten signatures and marks]

REYNOSA, TAMAUULIPAS, MÉXICO, A 15 DE JULIO DE 2017.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
OPILADO



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**


**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

incluye: humedecido de material, compactación al 90% a la prueba proctor, equipo, herramienta y mano de obra.			
Revestimiento de canal Salida de 10 cm. De espesor de la vialidad obra pluvial concreto premezclado f'c=150 kg/cm2 y malla electro soldada 10/10. Incluye: cimbra, descimbra, acabado escobillado en un área de 7.00x2.00m. Equipo, herramienta y mano de obra.	M2	14.00	0.00
PAVIMENTO HIDRULICO			
Suministro y colocación de polietileno hule negro calibre 600, en pavimento hidráulico, previo barrido, incluye: traslapes, pliegues, cortes, herramienta y mano de obra.	M2	3844.13	1198.18
Junta longitudinal, serán corrugadas de ½" de 6ª cm de longitud @ 75 cm. Colocadas con silletas o Insertadas por vibración si se usa equipo de cimbra deslizante, modulo para corte con disco, relleno bituminoso en juntas de dilatación según diseño y machihembrado longitudinalmente, incluye: herramienta material y mano de obra.	PZA	137.00	175.00
Junta transversal de expansión @30.00 m Con cartón asfáltico celotex de ½" o ¾" de 10 cm. De altura, con varilla lisa de ¾" @60 cm. Y 50 cm. De longitud (ancho de losa 6.60 m.)	PZA	16.00	3.87
Junta transversal de construcción tipo "A" formada con junta de control "zip cap" de PVC de 1/3 del espesor de la losa @3.00m. (Ancho de losa 6.60m)	PZA	1155.92	340.77
Pavimento hidráulico de 15 cm. De espesor, con concreto premezclado MR=42 kg/cm2 (f'c=300 kg/cm2), tma 19mm, rn 8-10 cm., colado alternado y machimbrado longitudinalmente, incluye: vibrador, curado,	M	3844.13	1198.18

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature





"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

tendido, rayado, equipo, materiales, herramienta y mano de obra.			
OBRA CIVIL (DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE)			
Trazo y nivelación topográfica Trazo y nivelación topográfica para obras de drenaje sanitario, estableciendo puntos de referencia, incluye: estacas, equipo, herramienta y mano de obra.	M	262.00	175.00
Excavación manual en zanjas en material común en seco, en zona B de 0.00 hasta 2.00 de profundidad.	M3	190.65	0.00
Excavación manual en zanjas en material común en agua, hasta 4.00 de profundidad.	M3	13.54	13.92
Excavación con equipo en zanjas en material común en agua, en zona B de 2.00 hasta 4.00 de profundidad.	M3	65.38	111.38
Extracción de tubería de concreto dañada de 20 cm. de diámetro.	M	89.00	89.00
Plantilla de palancón en zanjas para instalar tuberías	M3	26.50	28.00
Instalación de tubería sanitaria de PVC de 8" de diámetro.	M	177.00	173.60
Acarreo de tubería de P.V.C. de 8" de diámetro	M	177.00	173.60
Acarreo de tubería de P.V.C. de 3" de diámetro	M	85.00	82.00
Instalación de tubería de 3" de diámetro RD 26	M	85.00	82.00
Bombeo de achique con bomba autocombante propiedad del contratista de 3" de diámetro y 6 h.p.	HR	170.00	698.00
Relleno en zanjas compactación al 90% proctor con material producto de excavación.	M3	78.46	116.29
Relleno en zanjas compactación al 90%	M3	162.93	172.53

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**


proctor con material producto de banco.			
Ruptura y demolición de pozo de visita en diferentes diámetros.	POZ O	1.00	1.00
Pozo de visita tipo común hasta 2.00 m de profundidad incluye brocal y tapa de polietileno.	POZ O	2.00	2.00
Interconexiones en tubería de 20 cm de diámetro a los pozos de visita.	INTE R	1.00	1.00
Acarreo primer km producto de excavación en camión.	M3	246.26	200.53
Acarreo kms subsecuentes al 1er producto de excavación en camión.	M3- KM	2462.59	1002.65
Atraques de concreto	M3	0.30	0.12
Instalación de cople de reparación de 3" de diámetro pvc.	PZA	1.00	1.00
INSTALACIONES			
Instalación de toma domiciliaria corta de 3.00 mts, a base de tubo flexible de cobre (1/2"), incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm. De espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOM A	16.00	16.00
Instalación de toma domiciliaria larga de 9.00 mts, a base de tubo flexible de cobre (1/2"), incluye: excavación, relleno compactado en capas de 20 cm. De espesor, piezas especiales, herramienta, equipo y mano de obra.	TOM A	16.00	16.00
Descarga sanitaria de 6.00 mts de tubería 160 (6") de pvc S-20 incluye: excavación, relleno, materiales, piezas especiales, herramienta, y mano de obra.	PZA	33.00	33.00
SUMINSTRO			
Tuvo pvc sanitario serie métrica (serie-20) de 8" de diámetro.	M	177.00	173.60
Tuvo pvc hidráulico sistema ingles RD-26 de 3"	M	85.00	82.00

Fogel

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

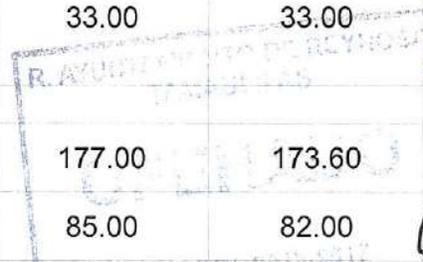



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

Cople de reparación pvc de 3"	PZA	1.00	1.00
Tapón campana pvc de 3"	PZA	1.00	1.00
EXTRAORDINARIOS			
Excavación con equipo en material seco hasta 2.00 m. de profundidad	M3	52.95	52.95

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

El control de los trabajos en las estimaciones 1, 2,3 y 4 estuvo a cargo de los C.C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza y Arq. Rafael Herrera Bustamante, Director de Obras Públicas y Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en la Administración 2013-2016, y los trabajos en la estimaciones 5,6,7,8 y 9 a cargo del C. Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento, Sub-Secretario de Obras Publicas y Construcción de la presente Administración.

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza a Empresa Contratista, Petición para realizar excedentes de los trabajos Extraordinarios, por el **C. Ing. Juan Manuel Lenskin Garza**, Director de Obras Públicas, Mediante oficio **N°.SOP-1403-16** de Fecha **25 de Julio de 2016**.

Se Autoriza **Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 90 Días naturales de Diferimiento**, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el día: **05 de Octubre de 2016**.

Se Autoriza **Segundo Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 60 Días naturales de prórroga**, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el día: **04 de Diciembre de 2016**.

Se Autoriza **Tercer Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 117 Días naturales**, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el día: **31 de Marzo de 2017**.



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

Se Formula una **Acta Circunstanciada** con el objeto de la **Terminación Definitiva** del contrato con fecha de 24 de Febrero de 2017 por motivo señalado en dicha acta.

IX. De las Metas

Contratadas: 462.98ML
Alcanzada: 429.20ML

X. Situación Física de la Obra:


Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.



Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx


**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**


XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construcción de Drenaje Pluvial Superficial en las calles: Revolución entre Solidaridad y Aquiles Serdán; Aquiles Serdán entre Revolución y Venustiano Carranza; Venustiano Carranza entre Aquiles Serdán y Lateral de canal, Incluye: Agua Potable y Drenaje Sanitario en calle Venustiano Carranza entre Aquiles Serdán y Manuel Buenrostro, Colonia 20 de Noviembre, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**

Por la Contratante:
El Municipio de Reynosa, Tamaulipas



Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente y Presidente
del Comité Técnico de Obras Publicas



Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento
Subsecretario de Obras Publicas y
Construccion y Segundo Vocal del Comité
Técnico de Obras Publicas



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**

Por la Contratista

C. Ing. Carlos Alberto Cano Martínez
Caap del Noreste, S.A de C.V.
calle flo. villa. #411
col-20. NOV-

Por los Beneficiarios

Nombre y Firma

Fernando Morrugares G



Matamoros 635 Oriente esq. Escobedo
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México. C.P. 88500
Tel. (899) 922-4258 | www.reynosa.gob.mx

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del
Nonagésimo Sexto Aniversario de la Constitución Política Local".

**Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega – Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-033-16-LP**


Testigos de Asistencia



C. Lic. Alejandro de la Garza Vielma
Contralor Municipal



**C. Lic. Zita del Carmen Guadarrama
Alemán**
Segundo Sindico





Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Bldv. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2092104
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1437025
AGENTE
2031

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO, A 12 DE MAYO DE 2017			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$284,743.65	\$284,743.65	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	OBRA		

AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

\$284,743.65 (**DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.**)

AFIANZADORA SOFIMEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$ 284,743.65 M.N. (DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR CAAP DEL NORESTE, S.A. DE C.V., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO SOP-REY-FAISM-033-16-LP DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON UN MONTO CONTRATADO DE \$ 5,414,073.36 M.N. (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N.) INCLUYE IVA, Y CON UN MONTO/EJERCICIO DE \$ 2,847,436.53 M.N. (DOS MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N.) INCLUYE IVA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL EN LAS CALLES: REVOLUCIÓN ENTRE SOLIDARIDAD Y AQUILES SERDAN; AQUILES SERDAN ENTRE REVOLUCION Y VENUSTIANO CARRANZA; VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AQUILES SERDAN Y LATERAL DE CANAL, INCLUYE: AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE AQUILES SEDAN Y MANUEL BUENROSTRO, COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASO EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TERMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SU HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. ***FIN DE TEXTO***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

mRiQsh+qSuDnndaGxVduOAm/BLD0KHgJrJyYCKeEwLcFxfWA44djH1U3aU8an8RN341FVfmXInqWmoF97XPnJubT4zN40MpiT0zhRAYjdLpbVouP105kVSB7uQ08M2MjaitKJ5VAIVeUbT4QMZ+QupMxyVINCC5anvsoe=OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937 ADVANTAGE SECURITY CA

LINEA DE VALIDACIÓN **0602092104QRRTDF**

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602092104QRRTDF
