



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**


Acta administrativa que se formula para hacer constar la **Entrega-Recepción** de la obra: **Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Club de Leones y Escuela Primaria Himno Nacional calle Venustiano Carranza entre Lateral de Canal Anzalduas y Callejón Pedro Moreno, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, sustentada en el contrato SOP-REY-FAISM-032-16-LP** y con fundamento en el artículo 73 y 10 Fracción X de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Tamaulipas.

Lugar hora y fecha:

En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las **12:00** horas, del día **29 de Diciembre de 2016**, reunidos en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del R. Ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, sita en la calle Matamoros N°635 Oriente esquina M. Escobedo, Zona Centro.

Intervienen:

Los ciudadanos el **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Públicas y Construcción y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, respectivamente. El **C. Ing. Gilberto Estrella Hernández**, en su carácter de representante legal de la Empresa: **Diseño Ingeniería y Construcción de Reynosa, S.A de C.V.**, y como testigos de asistencia los **C. Lic. Alexandro de la Garza Vielma** y **C. Lic. Zita del Carmen**





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**


Guadarrama Alemán, en sus carácter de Contralor Municipal y Segundo Sindico, respectivamente.

I. Del Objeto.

- 1.1. Nombre de la empresa o persona física que entrega.
Diseño Ingeniería y Construcción de Reynosa, S.A de C.V.
- 1.2. Número de Registro Federal de Contribuyentes.
DIC-000524-J34

II. De la Información Básica Inicial.

- 2.1. Nombre de la Dependencia que recibe.
Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
- 2.2. Dirección o Unidad encargada de la obra.
Dirección de Obras Públicas.
- 2.3. Nombre y localización de la obra.
Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Club de Leones y Escuela Primaria Himno Nacional calle Venustiano Carranza entre Lateral de Canal Anzalduas y Callejón Pedro Moreno, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
- 2.4. Entidad Federativa donde se realizaron los trabajos.
Estado de Tamaulipas.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

- 2.5. Fecha, número y monto de Contrato de la Obra.
23 de Mayo de 2016
SOP-REY-FAISM-032-16-LP
\$ 668,231.64 INCLUYE I.V.A
- 2.6. Aprobación
Acta de Cabildo No. 089/2016 de Fecha 15 de Abril de 2016
(Sesión ordinaria).

III. De los Antecedentes.

- 3.1. Recursos
FAISM
- 3.2. Modalidad de adjudicación
Licitación Pública
- 3.3. Fecha de iniciación de los trabajos según Contrato.
24 de Mayo de 2016
- 3.4. Fecha de terminación de los trabajos según Contrato.
12 de Julio de 2016
- 3.5. Fecha real de iniciación.
20 de Julio de 2016

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2017



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

3.6. Fecha Real de Terminación.
07 de Septiembre de 2016

IV. De las Garantías.

4.1. Para garantizar el Cumplimiento de cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato.

Fianza N° 1994572
Importe: \$ 66,823.16 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 23 de Mayo de 2016
Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.

4.2. Para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado.

Fianza N° 1994590
Importe: \$200,469.49 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 23 de Mayo de 2016.
Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.

4.3. Para garantizar los defectos que resultaren de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que se hubiera incurrido.

Fianza N° 2060183
Importe: \$ 66,823.16 INCLUYE I.V.A.
Fecha: 26 de Diciembre de 2016
Afianzadora: Afianzadora SOFIMEX, S.A.

Misma que es parte integral de la presente Acta.



[Firma manuscrita]
[Firma manuscrita]



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

V. De la inversión y estimaciones.

5.1.

No	Fecha	Periodo de Ejecución	Importe
1.	28 de Septiembre de 2016	20 de Julio de 2016 al 18 de Agosto de 2016	\$ 411,001.69
2.	29 de Septiembre de 2016	19 de Agosto de 2016 al 07 de Septiembre de 2016	\$ 165,060.07
		Sub-Total:	\$ 576,061.76
		16% I.V.A.	\$ 92,169.88
		Total	\$ 668,231.64

El cual forman parte integral de la presente Acta.

VI. De las sanciones.

No Hubo

VII. Procedimiento constructivo de los trabajos:

Conceptos	Unidad	Cantidad	
		Contratada	Alcanzada
Preliminares			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable.	M2	165.24	81.90
Corte con disco en firme de concreto.	ML	5.90	0.00
Demolición de concreto de cualquier resistencia a la compresión y cualquier dimensión con equipo neumático y herramienta menor, incluye: andamios,	M3	9.60	8.19

X

[Signature] 5

[Signature]

[Signature]

[Handwritten marks]
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO
FAISMUN 2016-2017



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

junta y acarreo libre a 50.00 m, carga a camión, mano de obra, equipo y herramienta.			
Cimentación			
Excavación en material tipo "B" a cualquier profundidad con herramienta manual en seco o húmedo. Incluye: afine de fondo, talud y traspaleo hasta 4.00 m, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	3.40	0.00
Dentellón corrido a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 40 x 55 cm, armado con 6 vs #6 y estribos Vs#2 @20 cm. Incluye: habilitado, armado, cimbra, colado, vibrado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.00	0.00
Tensor a base de concreto f'c=200 kg/cm2 de 20 x 20 cm, armado con 2vs lisas #5 y estribos vs #2 @25 cm. Incluye: habilitado, armado, cimbra, colado, vibrado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	19.00	0.00
Suministro y colocación de placa de acero de 1/2" de 6"x8", acero A-36. Incluye: suministro y aplicación mecánica de dos manos de acabado final amerlock 400, color blanco, acabado brillante marca Comex o similar sobre superficie uniforme y libre de mezcla, habilitado, material, mano de obra, equipo y herramienta.	KG	15.40	0.00
Suministro y colocación de rosca y tuerca para tensar.	PZA	10.00	0.00
Banqueta			
Reposición de banqueta o f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6/10-10 y polietileno calibre 600, con acabado semipulido con flota. Incluye: nivelación, fabricación, colado y curado de concreto, material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	96.00	81.90
Junta de construcción "JC" de 2 cm de espesor, calafateada con asfalto líquido y sellada con silicón para concreto, incluye: materiales, mano de obra, limpieza, herramientas y equipo.	ML	28.00	25.70
Limpieza			
Retiro de material producto de excavación y demolición de banqueta y concreto.	M3	20.74	8.19
Preliminares			
Limpieza, trazo y nivelación del terreno en área edificable.	M2	94.52	68.96
Corte con disco en muro de block.	ML	23.25	22.77
Demolición de muro de block de 15 cm. De espesor con equipo mecánico para maniobra de contención del muro en el proceso de demolición, incluye: retroexcavadora con extensión.	M2	64.05	65.97
Demolición de columna de 15x20 cm de espesor,	M3	1.29	0.83

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-001


[Handwritten signatures and initials in blue and green ink]



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP

incluye: equipo, herramienta y mano de obra.			
Demolición de cerramiento de 15x20 cm de espesor, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	1.93	2.17
Demolición de cimentación existente, incluye: equipo, herramienta y mano de obra.	M3	17.85	18.31
Excavación con maquinaria en zanjas en material tipo "B", incluye: afines de taludes, fondos.	M3	285.6	248.95
Demolición de registro sanitario redondo de 0.80 m.	PZA	1.00	1.00
Cimentación			
Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa, F'c= 200 kg/cm2	M3	15.45	16.74
Acero de refuerzo en cimentación, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KC	147.45	222.77
Relleno con material producto de excavación, compactado en capas de 20 cm. De espesor, incluye: relleno en zanjas para cimentaciones, traspaleos, incorporación de humedad, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	78.30	189.34
Suministro y colocación de grava triturada de ¾" en capas de 1 cm. Incluye: acarreo, herramienta y mano de obra.	M3	17.11	12.02
Muro de contención			
Concreto hidráulico en muro de contención, sin incluir moldes y obra falsa, F'c=200 kg/cm2.	M3	20.60	23.52
Acero de refuerzo en muro de contención, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KC	760.24	946.50
Cimbra para muro de contención de 3.45 m altura de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	153.44	167.50
Lloradero de 4" de diam.	ML	2.80	2.80
Escalera			
Concreto hidráulico en escalera sin incluir moldes y obra falsa, F'c= 200 kg/cm2.	M3	1.66	1.79
Acero de refuerzo en escalera, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KC	59.20	62.11
Acero de refuerzo en escalera, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #2).	KC	2.75	3.03
Cimbra para escalera de pino de 2da., acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	7.92	4.63
Banqueta			
Reposición de banqueta o F'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6 x 6/10-10 y polietileno calibre 600, con acabado semipulido con flota. Incluye: nivelación, fabricación, colado y curado de concreto, material, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	55.25	54.30



[Handwritten signature]
7

[Handwritten signature]
FAISMUN 2016-2018



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

Herrería			
Barandal metálico a base de tubo de 2" ced 30	KG	903.67	975.57
Portón metálico de 1.20x2.10 a base de tubo de 2" ced 30	KG	66.53	48.59
Suministro y aplicación de fondo anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	46.52	43.35
Suministro e instalación de porta candado.	PZA	1.00	1.00
Suministro e instalación de pasador de 1".	PZA	1.00	1.00
Limpieza			
Retiro de material producto de excavación y demolición de muro.	M3	49.08	90.82
Preliminares			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable.	M2	8.00	6.83
Demolición de muros de block	M2	33.66	22.56
Demolición de dalas y cerramientos de concreto de 15x20 cm.	M3	1.20	1.08
Excavación con maquinaria en zanjas en material tipo "B", incluye: afine de taludes, fondos.	M3	22.50	27.87
Cimentación			
Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa, F'c=200 kg/cm2	M3	3.52	2.96
Acero de refuerzo en cimentación, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KG	43.90	41.28
Relleno en zanjas para cimentaciones con material producto de excavación, compactado en capas de 20 cm. De espesor, incluye: traspaleos, incorporación de humedad, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	13.68	20.27
Muro de contención			
Concreto hidráulico en muro de contención, sin incluir moldes y obra falsa, F'c=200 kg/cm2.	M3	4.96	5.09
Acero de refuerzo en muro de contención, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KG	212.35	215.26
Cimbra para muro de contención de 2.45 m altura de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	39.20	36.36
Muro			
Muro de block hueco de concreto de 15x20x40 cm. Asentado con mortero cemento- arena 1:3, acabado común a plomo a cualquier altura, incluye limpiezas, acarreos, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	16.56	15.23
Castillo de 0.15x 0.20 m. armada con vr de #3 , anillos de ¼ a cada 20 cms.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, F'c=200 kg/cm.	M3	0.32	0.28

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO

FAISMUN 2016-2017

Handwritten signatures and marks, including a green checkmark, a signature, the number 8, and other scribbles.



Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP

Acero de refuerzo en castillo, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3)	KG	33.15	20.61
Acero de refuerzo en castillo, Fy=2530 kg/cm2 (alambón no.2)	KG	9.10	7.20
Cimbra para castillo con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	7.60	3.68
Cerramiento de 0.15x 0.20 m. con vr #3 anillos de ¼ a cada 20 cm.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, F' c=200 Kg/cm2	M3	0.48	0.22
Acero de refuerzo en castillo, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3)	KG	39.96	16.51
Acero de refuerzo en castillo F' c=2530 kg/cm2 (alambón no.2).	KG	12.88	5.70
Cimbra para castillo con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	6.40	2.97
Limpieza			
Retiro de material producto de demolición de muro.	M3	10.00	4.46
Preliminares			
Limpia, trazo y nivelación del terreno en área edificable.	M2	8.00	5.64
Demolición de muros de block.	M2	33.66	43.38
Demolición de dalas y cerramientos de concreto de 15x20 cm.	M3	1.20	1.50
Corte con disco en banquetta.	ML	8.80	9.08
Demolición en banquetta de concreto de 8 cms.	M3	0.32	0.32
Excavación con maquinaria en zanjas en material tipo "B", incluye: afines de taludes, fondos.	M3	6.72	16.14
Plantilla de 5 cm. De espesor concreto F' =100 kg/cm2	M2	6.40	5.98
Cimentación			
Concreto hidráulico en cimentación, sin incluir moldes y obra falsa, F' c=200 kg/cm2	M3	1.28	1.17
Acero de refuerzo en cimentación Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KG	40.30	36.15
Muro de enrase con block de 15x20x40 cm. Rellenos con concreto F' c=100 kg/cm2	M2	0.48	4.94
Dala de desplante de 0.20x0.15 m. armada con 4vr de #3 , anillos de ¼ a cada 20 cm.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, F' c=200 kg/cm2	M3	0.24	0.24
Acero de refuerzo en dala, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3).	KG	18.44	18.44
Acero de refuerzo en dala, F'y=2530 kg/cm2 (alambón no.2)	KG	6.44	6.30
Cimbra para dala con madera de pino de 2da., acabado	M2	3.20	3.20

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS
OPERADO

FAISMUN 2016-2017



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

común, incluye: cimbrado y descimbrado.			
Relleno en zanjas para cimentaciones con material producto de excavación, compactado en capas de 20 cm. De espesor, incluye: traspaleos, incorporación de humedad, equipo, herramienta y mano de obra.	M3	4.48	10.41
Muro			
Muro de block hueco de concreto de 15 x 20x40, asentado con mortero cemento-arena 1:3, acabado común a plomo a cualquier altura, incluye: limpiezas, acarreo, materiales, herramienta y mano de obra.	M2	19.92	36.29
Castillo de 0.15x0.20 m. armada con vr de #3, anillos de ¼ a cada 20 cm.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, F'c=200 kg/cm2	M3	0.54	0.60
Acero de refuerzo en castillo, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3)	KG	47.71	62.90
Acero de refuerzo en castillo, Fy=2530 kg/cm2 (alambón no. 2).	KG	10.48	20.40
Cimbra para castillo con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	7.60	9.07
Cerramiento de 0.15x0.20 m., armada con vr de #3, anillos de ¼ a cada 20 cm.			
Concreto hidráulico, sin incluir moldes y obra falsa, F'c= 200 kg/cm2	M3	0.48	0.72
Acero de refuerzo en castillo, Fy=4200 kg/cm2 (corrugada #3)	KG	36.96	54.97
Acero de refuerzo en castillo, Fy=2530 kg/cm2 (alambón no.2)	KG	12.88	20.16
Cimbra para castillo con madera de pino de 2da. Acabado común, incluye: cimbrado y descimbrado.	M2	6.40	9.60
Limpieza			
Retiro de material producto de excavación y demolición de macizo y banqueta.	M3	13.41	14.54

Que se fundamentan con las anotaciones de la Bitácora de la Obra, el cual forma parte integral de la presente Acta.

El control de los trabajos estuvo a cargo de los C.C. Arq. Jorge Rafael Herrera Bustamante e Ing. Juan Manuel Lenskin Garza, en su carácter de Secretario de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Director de Obras Publicas, respectivamente en la Administración 2013-2016.

4

Jorge Rafael Herrera Bustamante

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
OPERADO
FAISMUN 2016-2017

Juan Manuel Lenskin Garza



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

VIII. De las Modificaciones.

Se autoriza **Convenio Modificadorio por Ampliación al Plazo de Ejecución por 50 días naturales de Diferimiento**, quedando como nueva fecha de término de los trabajos el día: **07 de Septiembre de 2016.**

IX. De las Metas

Contratadas: 7.69ML
Alcanzada: 14.01ML

X. Situación Física de la Obra:


Terminado: (X)
No Iniciada: ()
Terminado, sin Operar: ()
Suspendido: ()

XI. Consideraciones Operativas de la Obra:

Opera Adecuadamente: (X)
Opera con Deficiencia: ()
No Opera: ()

A

[Signature]

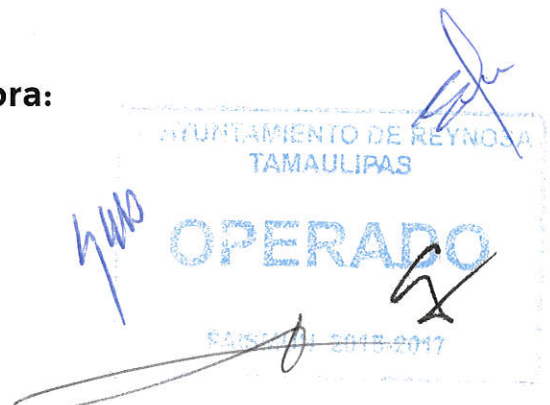



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

XII. Términos bajo los cuales se efectúa la recepción:

12.1. La dependencia dentro de los términos del contrato, recibe los trabajos descritos, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los trabajos faltantes, mal ejecutados, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos.

XIII. Firmas.

En la misma fecha y en el mismo acto, el municipio de Reynosa Tamaulipas a través de los CC. **Arq. Eduardo López Arias**, y el **Ing. Leopoldo Rodríguez Sarmiento**, en su carácter de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y Presidente del Comité Técnico de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas; Subsecretario de Obras Publicas y Construccion y Segundo Vocal del Comité Técnico de Obras Públicas o Servicios relacionados con la misma de la Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, recibe la obra: **Construccion de Barda Perimetral en Jardín de Niños Club de Leones y Escuela Primaria Himno Nacional calle Venustiano Carranza entre Lateral de Canal Anzalduas y Callejón Pedro Moreno, Colonia Ferrocarril Poniente, en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas.**



**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

Por la Contratante:

El Municipio de Reynosa, Tamaulipas

Arq. Eduardo López Arias
Secretario de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente y Presidente del Comité
Técnico de Obras Publicas

**Ing. Leopoldo Rodríguez
Sarmiento**
Subsecretario de Obras Publicas y
Construccion y Segundo Vocal del
Comité Técnico de Obras Publicas

Por la Contratista

C. Ing. Gilberto Estrella Hernández
Diseño Ingeniería y Construcción de Reynosa, S.A de C.V.





**Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Secretaría de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

**Acta de Entrega - Recepción
Relativa al Contrato: SOP-REY-FAISM-032-16-LP**

Por los Beneficiarios



Eduardo González Oliveros

Nombre y Firma

Testigos de Asistencia

**C. Lic. Alexandro de la Garza
Vielma**
Contralor Municipal

**C. Lic. Zita del Carmen
Guadarrama Alemán**
Segundo Sindico

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

OPERADO
FAISM 2016-2017



Afianzadora
SOFIMEX S.A.

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes
Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500

R.F.C. ASG-950531-ID1
www.sofimex.com.mx

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2060183
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
1362189
AGENTE
2031

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
CIUDAD DE MEXICO, A 26 DE DICIEMBRE DE 2016			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$66,823.16	\$66,823.16	PESOS	14
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	OBRA		
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:			
\$66,823.16 (**SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.**)			

AFIANZADORA SOFIMEX, S. A., SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE \$ 66,823.16 M.N. (SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS 16/100 M.N.), ANTE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE. PARA GARANTIZAR POR DISEÑO, INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE REYNOSA, S.A. DE C.V., LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO SOP-REY-FAISM-032-16-LP DE FECHA 23 DE MAYO DE 2016 Y DE SUS ANEXOS, CON N MONTO CONTRATADO DE \$ 668,231.64 M.N. (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE IVA, Y CON UN MONTO EJERCIDO DE \$ 668,231.64 M.N. (SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 64/100 M.N.) INCLUYE IVA, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE Y NUESTRO FIADO, REFERENTE A: CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES Y ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE LATERAL DEL CANAL ANZALDUAS Y CALLEJON PEDRO MORENO, COLONIA FERROCARRIL PONIENTE, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, LA REPARACIÓN DE DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA EJECUTADA Y/O LOS SERVICIOS PRESTADOS ASÍ COMO DE CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO NUESTRO FIADO. ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AUN CUANDO PARTE DE ELLAS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE LOS VICIOS O DEFECTOS QUE RESULTEN DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA Y/O SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS. LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO, EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO, Y SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS, EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES, HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO, EN LOS CASO EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA AFIANZADORA ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL MONTO GARANTIZADO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN QUE ELIJA EL BENEFICIARIO DE ENTRE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARA A PARTIR DE QUE SE HAGA EXIGIBLE LA OBLIGACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO GARANTIZADO QUE REPRESENTA LA CUANTIFICACIÓN DE LA REPARACIÓN EFECTUADA O POR EFECTUAR DE LOS VICIOS, DEFECTOS O MAL FUNCIONAMIENTO RESULTANTES, O DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO. ESTA COMPAÑÍA AFIANZADORA TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO AL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS, Y/O SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NUESTRO FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARA SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA SIEMPRE Y CUANDO NUESTRO FIADO NO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE, UNA VEZ TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE LEY PARA HACERLA EXIGIBLE SIN QUE DENTRO DE DICHO PLAZO SU HUBIERA PRESENTADO RECLAMACIÓN DE PAGO. ***FIN DE TEXTO***

FIRMA

PRIEGO SANCHEZ NINFA ISELA
GERENTE DE OFICINA

AYUNTAMIENTO DE REYNOSA
TAMAULIPAS

SELLO DIGITAL

XM6c4HWkYwe2osU3tFfX0iMD+JzKnz5oOO9xL8TfE0c3uuMeKt3fx2kMMQdpsYiwYwNjof4HzM9VLhCwcA4y+4OgyLihV7ahxcugABH7paxnCmfcRkQc4t52u7B4k6jzrODIO6PNJAnuL136PU0eJiNg5WL1WA3nu+L4oP
OMAR XICOTENCATL GUTIERREZ ROBLES. SERIE= 3030 3939 3939 3030 3030 3131 3030 3030 3338 3937. ADVANTAGE SECURITY CA

1 LINEA DE VALIDACIÓN

0602060183D3WQHR

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Regulatoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.com.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602060183D3WQHR
